




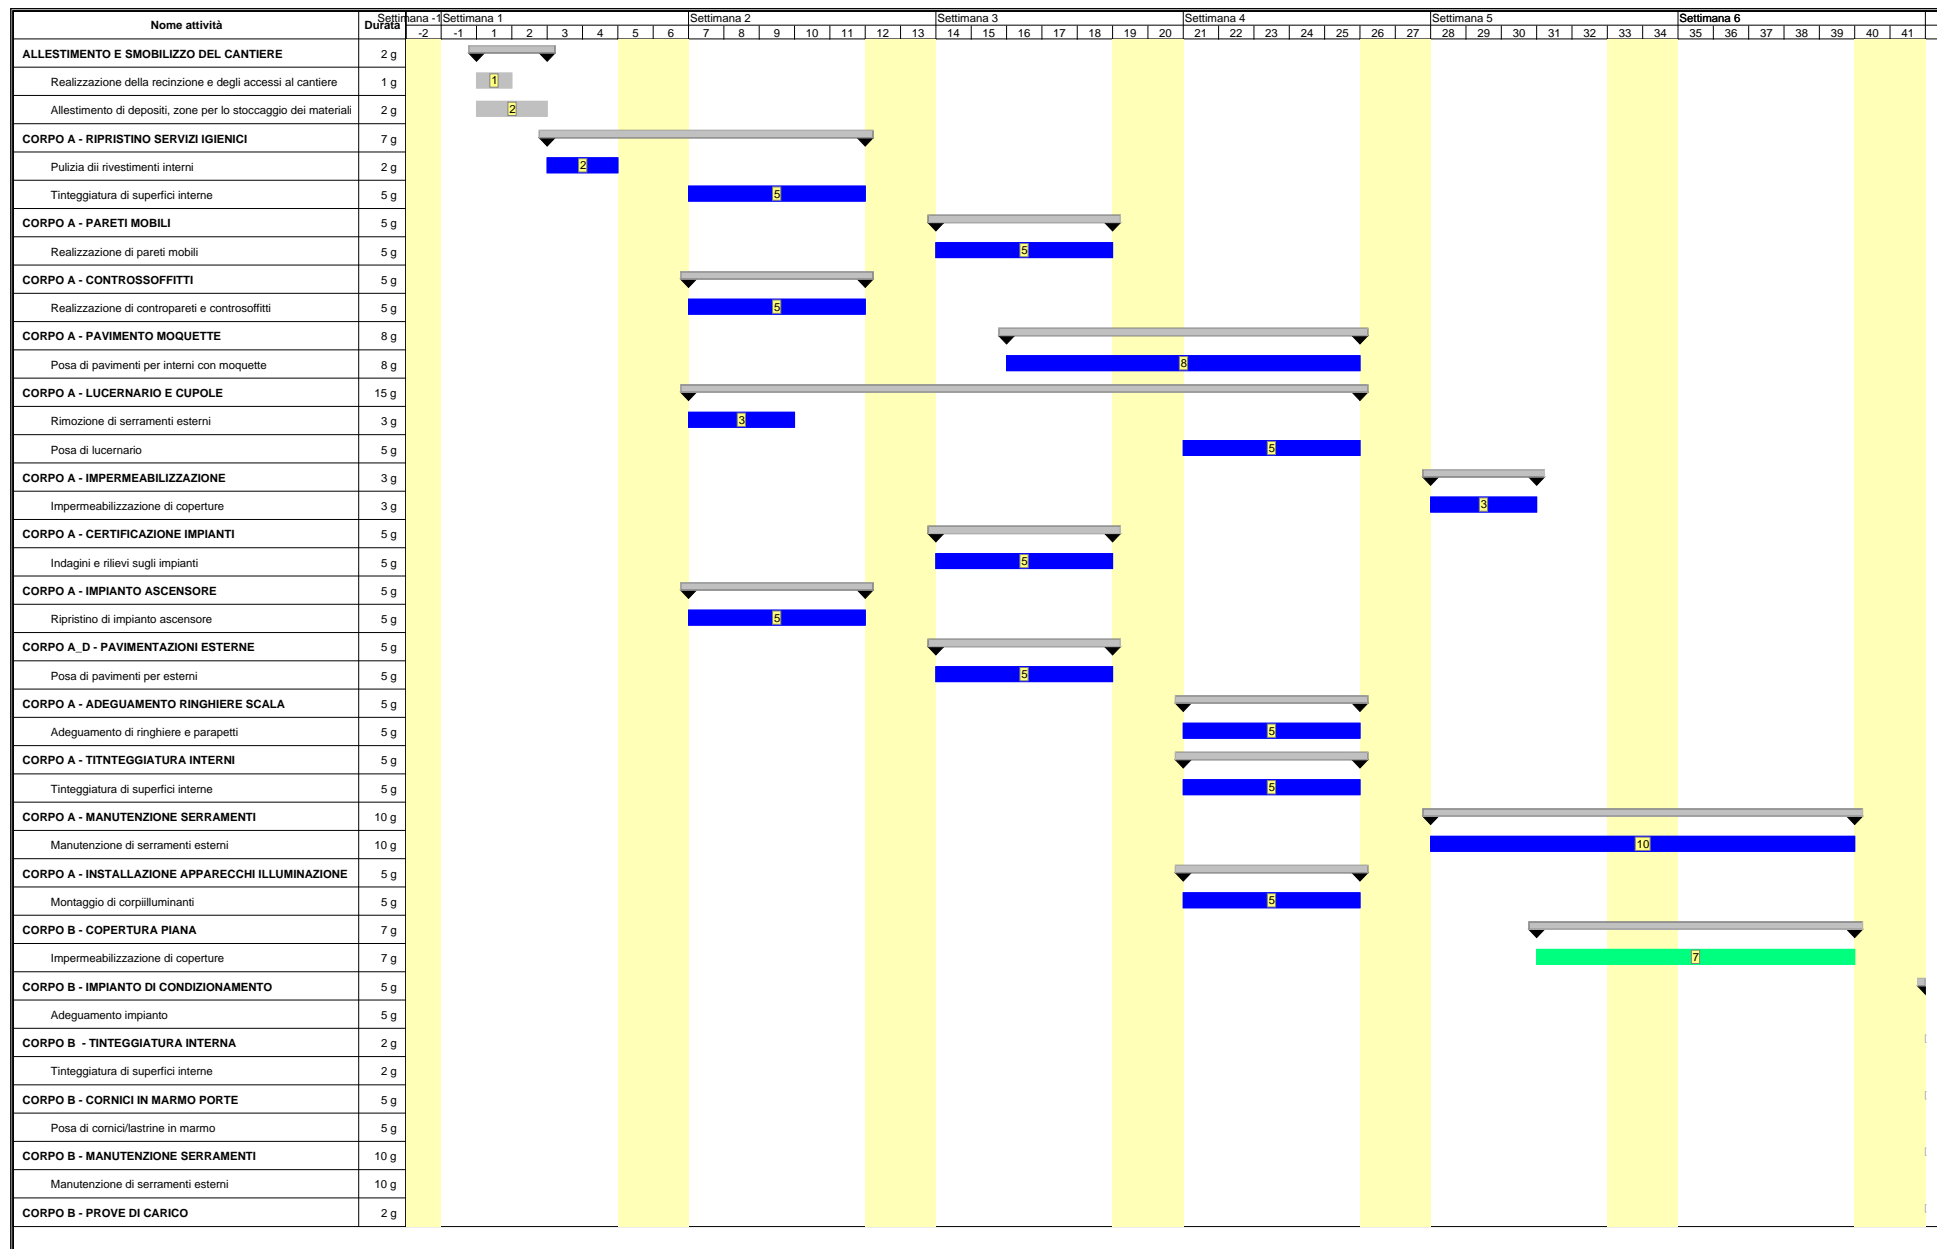
COMUNE DI SELARGIUS

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

OPERE DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ALLEGATO H	Cronoprogramma	Data GIUGNO 2015 Revisione SETTEMBRE 2015 Scala
PROGETTAZIONE Dott. Ing. Antongiulio SORMANI 	DIRETTORE AREA 6 - LAVORI PUBBLICI Dott. Ing. Adalberto Pibiri RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Cecilia Cannas	



Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6																								
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41								
Prove di carico	2 g																																																			
CORPO C - COPERTURA PIANA	5 g																																																			
Impermeabilizzazione di coperture	5 g																																																			
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g																																																			
CORPO C - MANUTENZIONE SERRAMENTI	10 g																																																			
Manutenzione di serramenti esterni	10 g																																																			
CORPO D - MANUTENZIONE SERRAMENTI	10 g																																																			
Manutenzione di serramenti esterni	10 g																																																			
CORPO D - PLUVIALE SALA CONVEGNI	5 g																																																			
Sostituzione discendente	5 g																																																			
IMPIANTO ANTINCENDIO	10 g																																																			
Scavo a sezione obbligata	1 g																							1																												
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g																							1																												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazioni	1 g																							1																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																								1																											
Posa prefabbricati per impianto antincendio	5 g																																																			
Posa del gruppo di pressurizzazione	5 g																																																			
CABINA ELETTRICA	5 g																																																			
Intervento di verifica sui quadri	5 g																																																			
Adeguamento delle griglie di aereazione	5 g																																																			
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - TRASPORTI	2 g																																																			
Trasporto ad impianto autorizzato di materiali di risulta	2 g																																																			
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	1 g																																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																																			

